


## N552 – chantier Dour-Hautrage : les travaux plus conséquents menés en première phase ne permettront pas de réaliser dès maintenant la seconde phase à proximité de l'échangeur de Hautrage

28 mai 2021


**La seconde phase du chantier de réhabilitation de la N552 qui devait se tenir à hauteur de l'échangeur de Hautrage (N552-E42/A16) dès ce 31 mai ne pourra pas être réalisée dans l'immédiat.**

Cette seconde partie du chantier, s'étendant de la rue du Petit Crépin au carrefour N552/rue Malenroye, a dû être annulée suite à des imprévus survenus sur la première phase du chantier. Afin de réaliser un travail de qualité, il a en effet été nécessaire d'y intervenir de manière plus conséquente en construisant une nouvelle fondation, ce qui a mobilisé le budget prévu pour l'ensemble des travaux. Les équipes analysent les possibilités de réaliser cette phase par la suite.

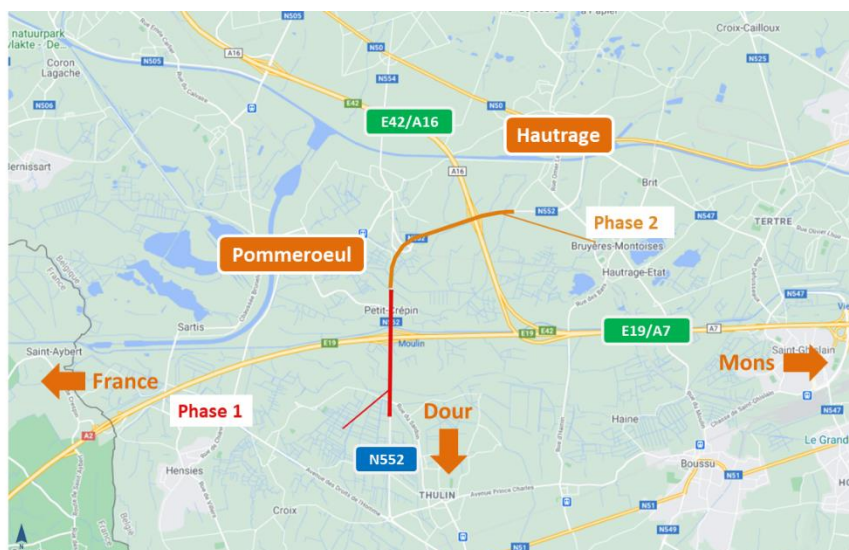

## POUR RAPPEL

La phase 1, qui s'étendait du carrefour N552/rue du Sardon/Rue du Fayt jusqu'à la rue du Petit Crépin (1,5 km) et qui portait sur les deux sens de circulation a été réalisée du 12 avril au 12 mai.

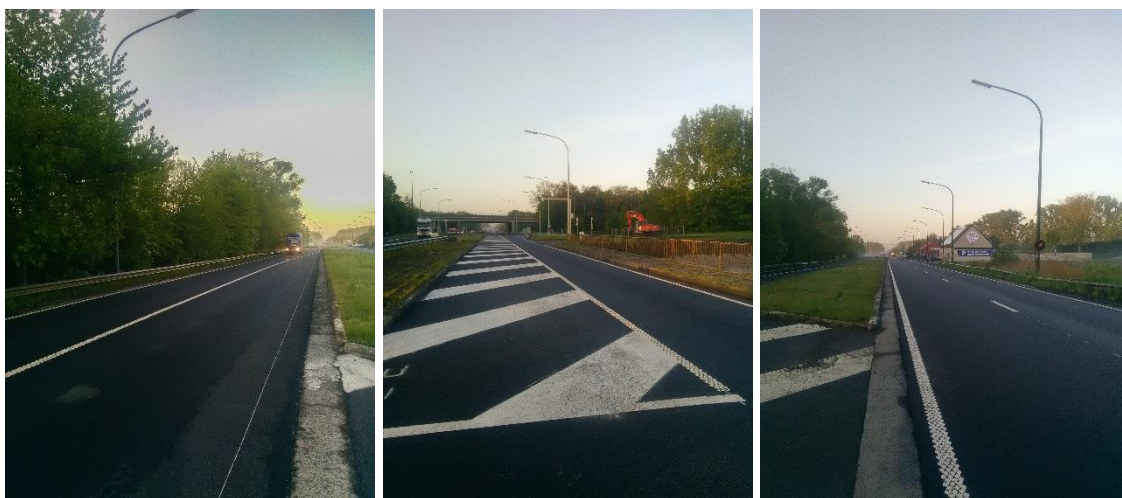

Ce chantier est financé par la SOFICO dans le cadre de son Plan de relance des chantiers (auto)routiers approuvé en juillet dernier, pour un budget de 1.700.000€ HTVA. Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO: le SPW Mobilité et Infrastructures.

### Contact :

Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | [heloise.winandy@sofico.org](mailto:heloise.winandy@sofico.org)

Rejoignez-nous !    
